

В целях проверки хода исполнения поручения Губернатора Новосибирской области Травникова А.А., данного по результатам личного приема жительницы с. Кочки Кочковского района по вопросу содействия в завершении строительства и реконструкции ГБУЗ НСО «Кочковская центральная районная больница» в с. Кочки Кочковского района, **25.09.2024** проведен выезд мобильной приемной Губернатора Новосибирской области при управлении по работе с обращениями граждан – общественной приемной Губернатора области (далее – мобильная приемная Губернатора области).

В ходе работы мобильной приемной Губернатора области установлено следующее.

Законом Новосибирской области от 21.12.2023 № 413-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» по объекту «Реконструкция больничного комплекса Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Кочковская центральная районная больница» (далее – Объект) предусмотрены средства областного бюджета на 2024 год и на 2025 год. Между ГКУ НСО «УКС» и ООО СК «СВС» 16.03.2023 заключен государственный контракт на выполнение подрядных работ по строительству Объекта.

Контрактом предусмотрено выполнение работ по реконструкции поликлиники на 300 посещений в смену, хозяйственного блока (гараж), административного здания, по строительству пищеблока, прачечной, морга, хозяйственного корпуса с блоком хранения и обеззараживания.

На 25.09.2024 выполнение от объема работ по поликлинике составляет 85%.

Ведутся работы по отделке внутренних помещений, фасада, установке сантехники, фасада

Приступили к строительству здания прачечной, выполнена кирпичная кладка наружных стен и перегородок, что составляет 30% от объема работ по прачечной.

К строительству, реконструкции других зданий не приступали.

Выполнены работы:

Подготовительные работы – 100%;

Демонтажные работы по поликлинике – 100%.

Поликлиника 4 этап:

Перегородки – 100%;

Фасад – 90%;

Кровля – 95%;

Система отопления – 100%;

Отделочные работы – 65%;

Крыльца – 50%;

Лифтовая шахта (пристройка к поликлиники) – 100%;

Сети связи – 80%;

Вентиляция – 90%;

Система водоснабжения и водоотведения – 90%;

Система электроснабжения – 85%;

Наружная система теплоснабжения – 100%;

Наружная система водоотведения – 90%;

Наружная система водоснабжения – 100%.

5 этап:

Демонтаж прачечной – 100%;

Котлован и сваи пищеблок – 100%;

Ростверк пищеблок – 100%;  
Котлован и сваи патологоанатомического корпуса – 100%;  
Ростверк патологоанатомического корпуса – 100%;  
Котлован и сваи прачечная – 100%;  
Наружные стены и перегородки прачечной – 100%.  
Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 29.08.2025.



Въездные ворота



Парковка для посетителей



Прилегающая территория



Административный корпус



Работы по отделке фасада



Котлован и сваи пищеблока



Наружные стены и перегородки прачечной



Гаражные боксы, технические помещения



Территория на строительной площадке






Помещения на 1 этаже





Помещения на 2 этаже

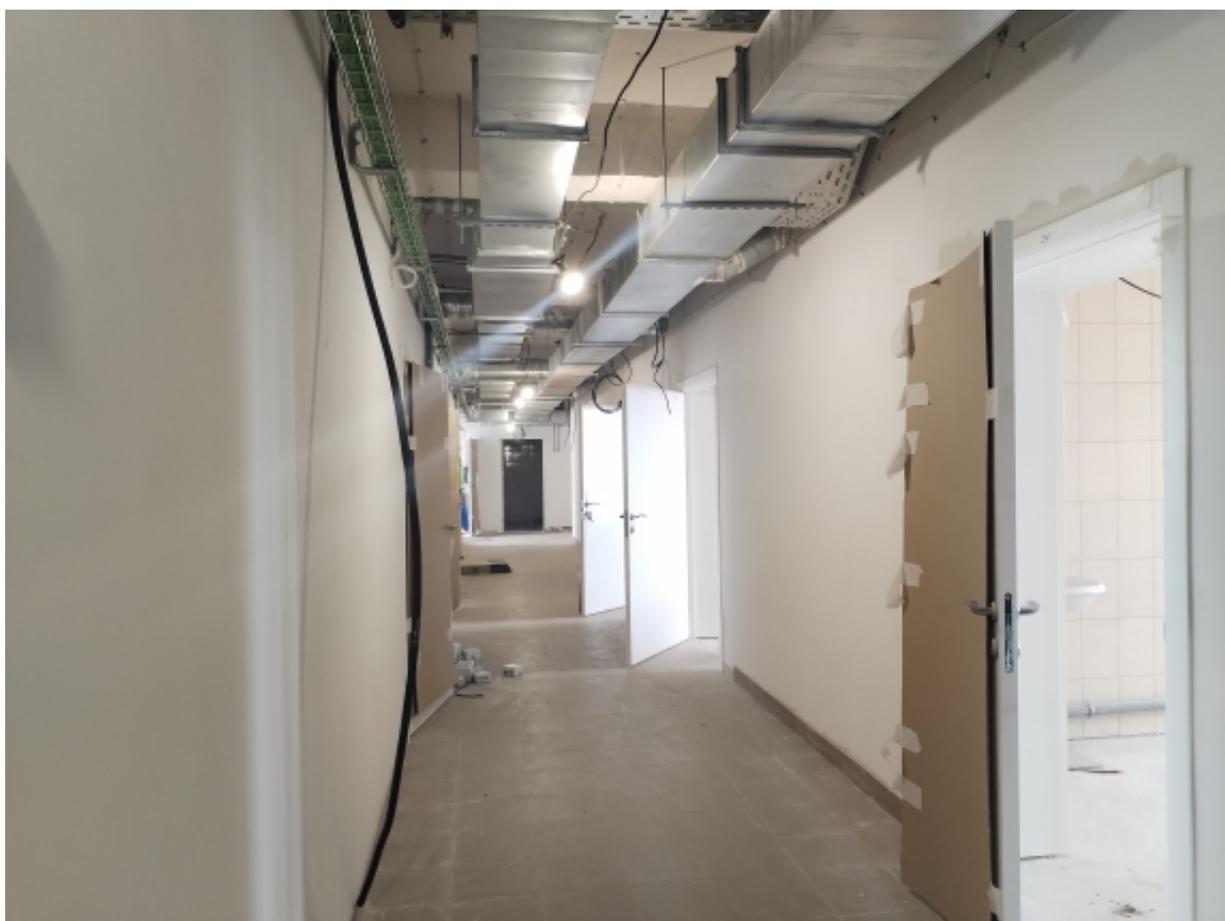





Складированное новое имущество и оборудование

