

12 декабря 2018 года на личном приеме к Губернатору Новосибирской области Травникову А.А. обратился житель г. Бердска по вопросу о содействии в завершении строительства детского сада и решении проблемы транспортной доступности к строящимся социальным объектам - детскому саду и школе в микрорайоне «Южный» в г. Бердске.

01.02.2019 в целях контроля исполнения поручений Губернатора Новосибирской области по результатам личного приема, был проведен выезд мобильной приемной Губернатора Новосибирской области с участием представителей администрации г. Бердска и МКУ «Управление капитального строительства» г. Бердска.


Строительство трехэтажного здания детского сада вместимостью 220 мест с подвальным этажом завершено, к зданию подведены все необходимые инженерные коммуникации (водо-, электро- и теплоснабжения), оборудованы системы канализования и водоотведения. Ведутся внутриотделочные работы, завезено необходимое оборудование в пищеблок и другие хозяйственные помещения. Территория детского сада огорожена, благоустройство будет проведено в весенне-летний период 2019 года. Ввод детского сада в эксплуатацию запланирован на август 2019 года.

Ведутся работы по строительству здания школы переменной этажности (3, 4 этажа) на 1100 мест. Возведено от 1-го до 3-х этажей здания школы, ведутся работы по оборудованию фундаментов спортивного зала и газовой котельной, теплового перехода от помещений школы к спортивному залу. Строительная площадка огорожена, оборудована уличным освещением и подъездными путями. Сдача школы в эксплуатацию запланирована на 2020 год.

Все работы на объектах выполняются в соответствии с графиком производства работ.

Необходимо обеспечить строительство и благоустройство подъездных дорог и тротуаров к строящимся детскому саду и школе в установленные сроки сдачи объектов (детский сад - 2019 год, школа - 2020 год).

Строительство детского сада

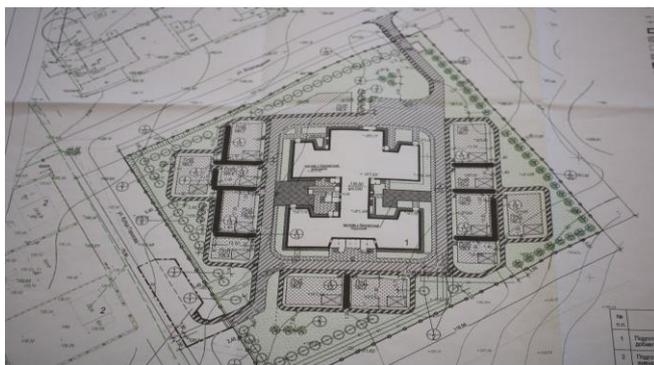



Строительство школы





Строительство спортзала



Строительство теплового перехода к спортзалу

Строительство газовой котельной

