В целях проверки хода исполнения поручения Губернатора области, данного по результатам личного приема 17.02.2021 жителя г. Искитима по вопросу содействия в завершении строительства мостового перехода через р. Ик на автомобильной дороге «Легостаево-Новососедово-Верх-Ики» в д. Новососедово Искитимского района, 22.07.2021 проведен выезд мобильной приемной Губернатора Новосибирской области при управлении по работе с обращениями граждан - общественной приемной Губернатора области (далее - мобильная приемная Губернатора области).

В работе мобильной приемной Губернатора области приняли участие работники министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области и ГКУ НСО «Территориальное управление автомобильных дорог».

В соответствии с заключенным контрактом подрядная организация ООО «КМС-Строймонтаж» выполняет работы по строительству мостового перехода.

В 2020 году завершены работы по устройству опор №№ 1, 2, 3, 4, монтажу металлических гофрированных арок, возведению тела насыпи земляного полотна на подходах к мостовому сооружению.


В период с января по май 2021 года ГКУ НСО «Территориальное управление автомобильных дорог (государственный заказчик), совместно с ФГБОУ ВО СГУПС и ЗАО «Гофросталь», велась работа по уточнению достоверности первоначально принятых проектных решений. Проектной организацией ООО «Масдорпроект» были внесены изменения в проектную документацию (в раздел ПОС), в части устройства обратной засыпки металлических гофрированных конструкций пескоцеметной смесью. Для повышения прочности, надежности и долговечности мостовой конструкций также принято решение выполнить дополнительные объемы работ по замене метизов крепления гофрированных листов металлических арок. После завершения замены метизов подрядная организация приступит к обратной засыпке сооружения.

Работы ведутся в соответствии с откорректированным календарным графиком производства дорожно-строительных работ, в соответствии с принятыми проектными решениями, открытие автомобильного движения по мостовому сооружению планируется в срок до 30 октября 2021 года.





Грунт для возведения тела насыпи земляного полотна мостового сооружения

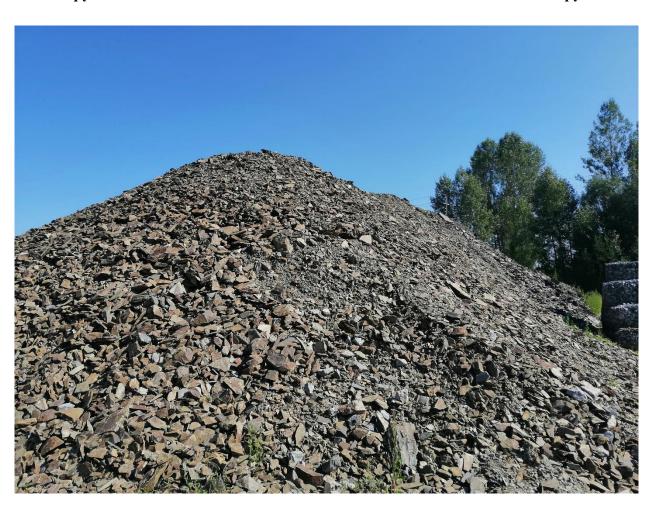

Метизы крепления гофрированных листов металлических арок, подлежащие замене *(15 тыс. штук)* 



