

В целях проверки фактов, изложенных в обращении в адрес Губернатора области жительницы с. Криводановка Новосибирского района по вопросам аварийного состояния спортивного комплекса в с. Криводановка и отсутствии освещения на его территории, **12.05.2022** проведен выезд мобильной приемной Губернатора Новосибирской области при управлении по работе с обращениями граждан - общественной приемной Губернатора области (далее - мобильная приемная Губернатора области).

В работе мобильной приемной Губернатора области приняли участие работники общественной приемной Губернатора области, министерства физической культуры и спорта Новосибирской области, администраций Новосибирского района и Криводановского сельсовета Новосибирского района, в том числе с участием заявительницы.

В ходе работы мобильной приемной Губернатора области факты, изложенные в обращении, подтвердились частично.

Строительство физкультурно - оздоровительного комплекса открытого типа в с. Криводановка Новосибирского района (далее - Комплекс) выполнено в рамках реализации федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография» и государственной программы Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области». Муниципальному бюджету Новосибирского района предоставлена субсидия из средств областного и федерального бюджетов на закупку спортивно-технологического оборудования и из областного бюджета на устройство основания и монтаж оборудования.

Вследствие ограниченности бюджетных ресурсов, при проектировании объекта принято решение об исключении благоустройства (выполняется силами ОМС) и ограждения, в том числе в целях своевременного прохождения государственной экспертизы. При проверке документации, со стороны экспертов направлено требование о включении проекта ливневой канализации, что изменило итоговую стоимость строительства, привело к необходимости увеличения лимитов областного бюджета и скорректировало сроки начала реализации.

В результате проведения торгов, работы по подготовке основания начались в октябре 2020 года. Ряд работ было перенесено на весенний период 2021 года в рамках исполнения гарантийных обязательств. Работы были полностью завершены в сентябре 2021 года.

Выполнение работ по строительству Комплекса (включая монтаж спортивного оборудования) производилось ООО ПСФ «ПРОГРЕСС» с привлечением ООО «ПСК» для организации строительного контроля. Все работы, выполненные подрядными организациями в рамках муниципальных контрактов, имеют гарантийные обязательства - 5 лет.

Для замены кровельного покрытия трибунного помещения из поликарбоната на профилированный металлический лист из бюджета Новосибирского района было выделено 138,22 тыс. рублей, работы завершены 11.05.2022.

В комплекте оборудования Комплекса было поставлено синтетическое рулонное покрытие для беговых дорожек. Основание для данного покрытия выполнено в соответствии с нормативной документацией и принято строительным контролем. Однако итоговая плоскость крайне зависима от


локальной подвижности грунтов, что и привело к появлению недостатков после зимнего периода. В настоящее время состояние беговых дорожек определено как допустимое. В случае необходимости администрацией Новосибирского района будет рассмотрена возможность нанесения на беговые дорожки дополнительного выравнивающего слоя из резиновой крошки и полимерного связующего.

Завершение благоустройства территории объекта запланировано за счет средств администрации Новосибирского района в течение 2022 года.

Администрацией Новосибирского района проводится оценка стоимости разработки проектно-сметной документации освещения Комплекса и двух раздевалок блочно-модульного типа, вопрос финансирования будет рассматриваться на очередной сессии Совета депутатов Новосибирского района в июне 2022 года.

В связи с ограниченностью бюджетных ресурсов администрации Новосибирского района возможность выполнения комплексного ограждения будет рассматриваться при формировании финансовой потребности на 2023 год.

Муниципальным заказчиком МКУ «Управляющая компания единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства и строительства» ведется претензионная работа с подрядной организацией ООО ПСФ «ПРОГРЕСС», по результатам которой выявленные недостатки, относящиеся к гарантийным обязательствам, будут устранены.

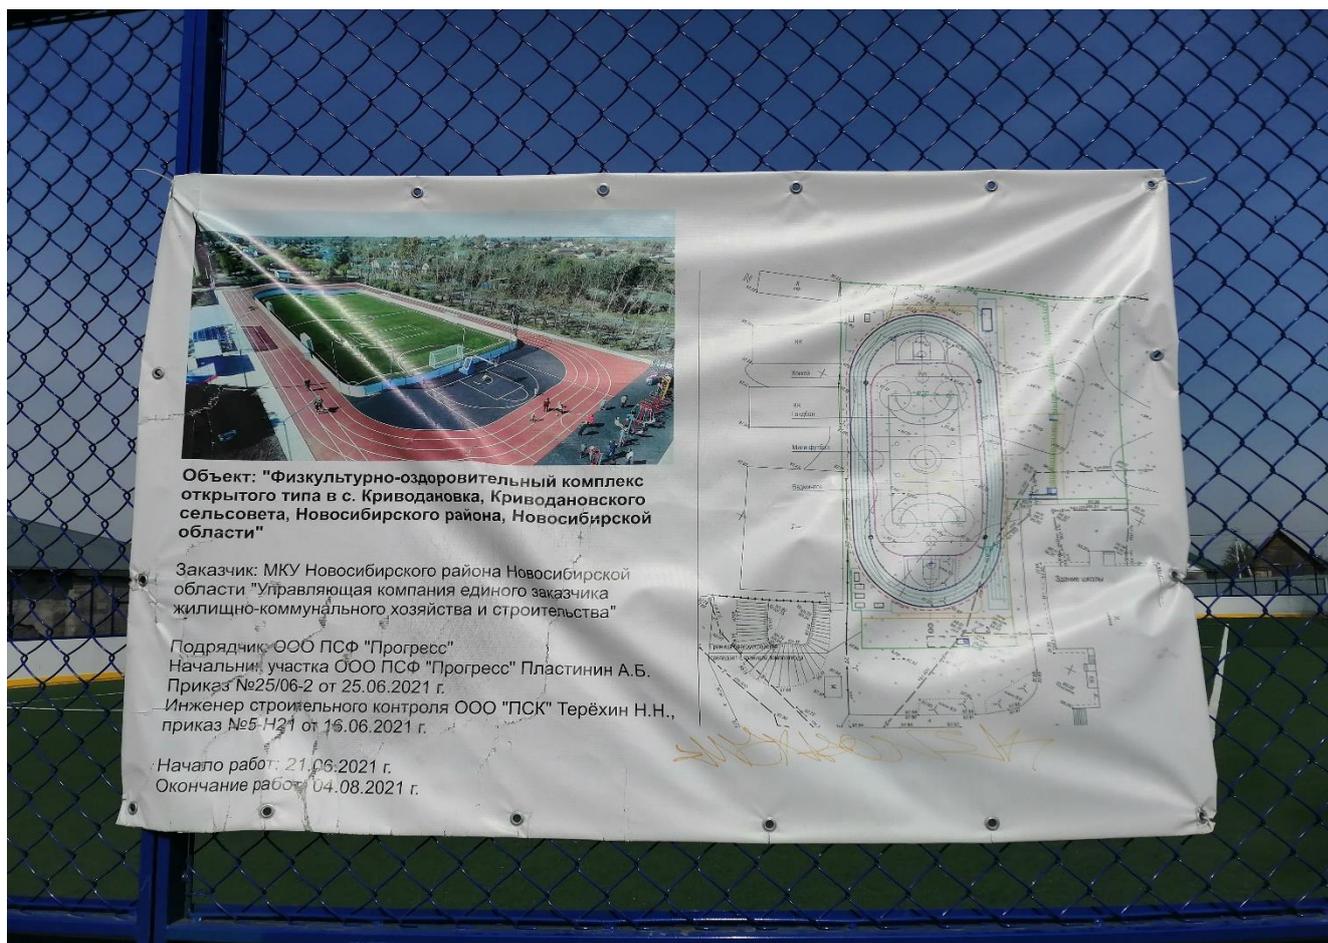

## Физкультурно - оздоровительный комплекс открытого типа



## Закрепленные тренажеры и спортивные снаряды







**Поле с искусственным газоном для игры в мини-футбол и трибунным помещением  
(зимой - хоккейная коробка)**



**Съемные ворота**



**Трибунное помещение с отремонтированной крышей**



**Площадка для мини - баскетбола**



**Площадка для прыжков в длину**



## Беговая дорожка с дренажной системой



## Проверка качества укладки покрытия беговой дорожки



## Неотапливаемые раздевалки блочно - модульного типа

