

В целях проверки хода исполнения поручения Губернатора Новосибирской области Травникова А.А., данного по результатам личного приема жителя р.п. Коченево Коченевского района по вопросу содействия содействию в строительстве комплекса объектов водоочистки и водоподготовки в р.п. Коченево Коченевского района, **11.09.2024** проведен выезд мобильной приемной Губернатора Новосибирской области при управлении по работе с обращениями граждан – общественной приемной Губернатора области (далее – мобильная приемная Губернатора области).

В ходе работы мобильной приемной Губернатора области установлено следующее.

В рамках федерального проекта «Чистая вода» на территории рабочего поселка Коченево осуществляется строительство объекта «Строительство комплекса объектов по водоочистке и водоподготовке в рабочем поселке Коченево Коченевского района Новосибирской области» (далее – Комплекс).


Муниципальный контракт на выполнение подрядных работ по строительству Комплекса заключен администрацией р.п. Коченево Коченевского района 29.03.2022 с обществом с ограниченной ответственностью «Специальное и Транспортное Строительство» (далее – ООО «СпецТрансСтрой»), срок окончания работ по контракту – 31 октября 2023 года.

Подрядной организацией ООО «СпецТрансСтрой» нарушены обязательства по исполнению муниципального контракта по срокам завершения строительно-монтажных работ и ввода Комплекса в эксплуатацию. Причиной нарушения срока выполнения подрядных работ по строительству Комплекса является ненадлежащая организация ООО «СпецТрансСтрой» производства строительных работ и качество проектно-сметной документации.


Строительство объекта по ул. Лермонтова завершено на 100%, станция водоподготовки запущена в работу, очищенная вода подана в сеть. Необходимо произвести работы по благоустройству территории.

Реконструкция существующей станции второго подъема по ул. Южная выполнена на 100%. Необходимо провести пуско-наладочные работы и завершить работы по благоустройству территории. Вода от скважин №6 и №7 подана в сеть без очистки.

Объект по водоочистке и водоподготовке по ул. Лермонтова в р.п. Коченево

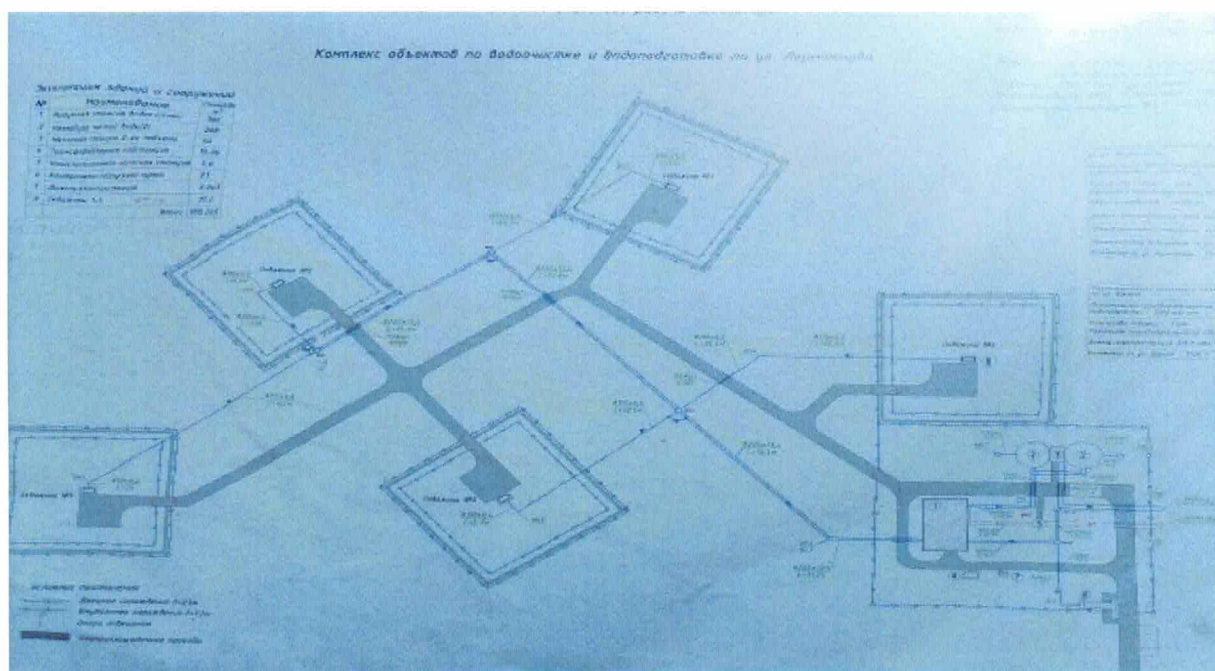

Пункт охраны объекта

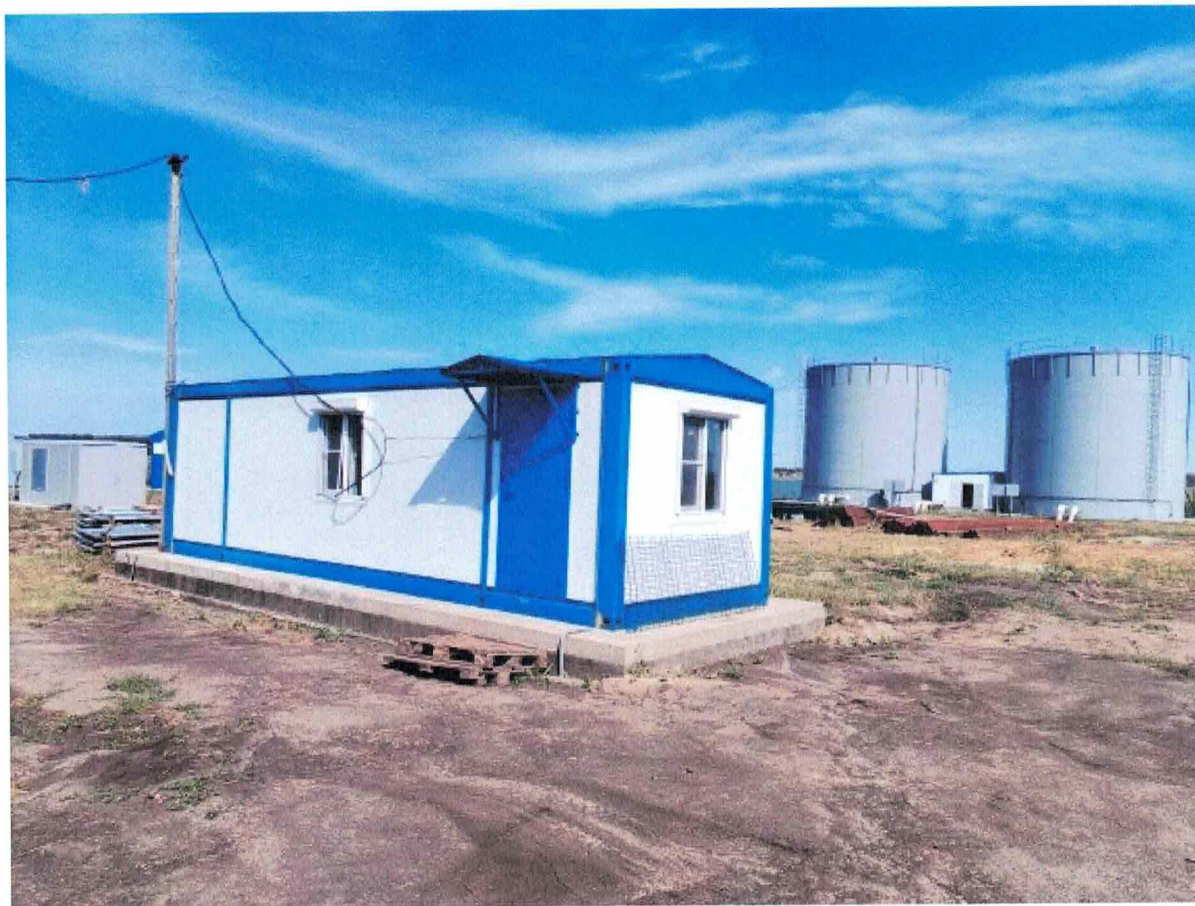

Станция водоподготовки






Резервуары чистой воды



Электростанция




Дизельный электрогенератор

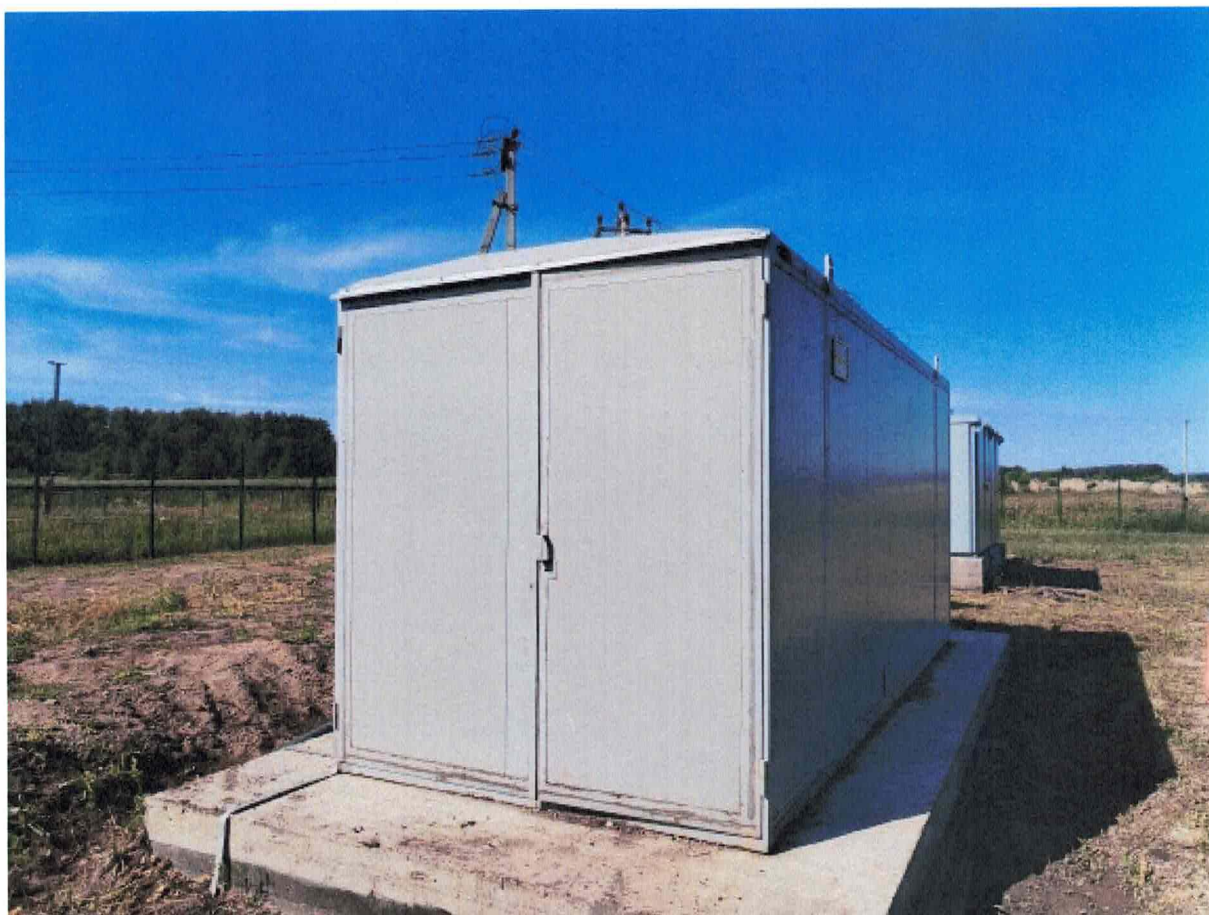

Реконструкция существующей станции второго подъема по ул. Южная



Станция водоподготовки

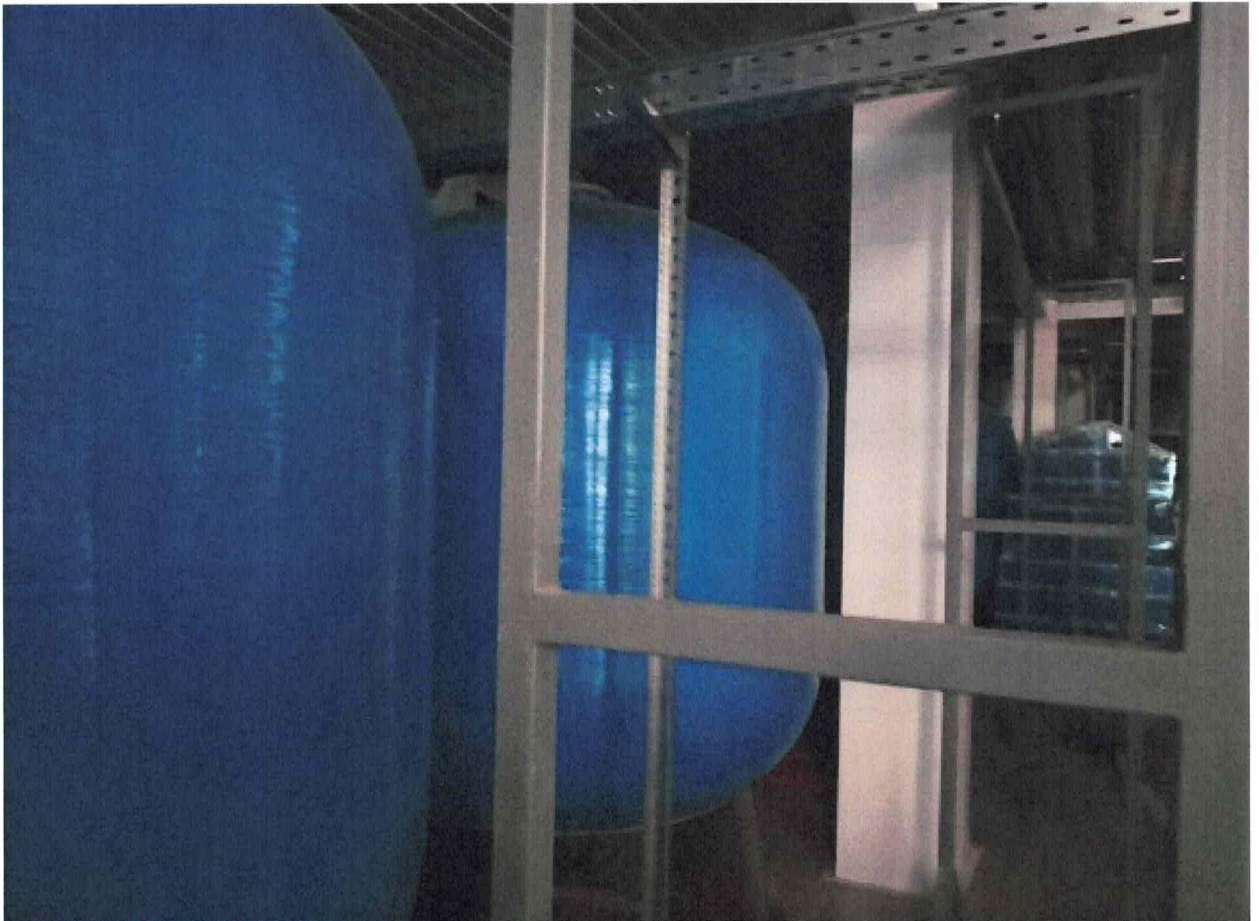



Насосная станция второго подъема





Дизельный электрогенератор

